

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 22/03/2016 Inspecteur: Koen De Lausnay Mentor: - Installateur: Electro Industriële
Datum verslag: 22/03/2016 B.T.W. nr.: - IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 1779012 Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Bouwenstraat
Huisnummer 29 app 301
Postcode 2140
Gemeente Borgerhout
Type appartement

Eigenaar:

Naam Antwerpse bouwwerken
Straatnaam -
Huisnummer -
Postcode -
Gemeente -

AN : -

Teller Nr.: -

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 13 Aardelektrode: Lus pen weerstand: 5,5 Ω Isolatie: 2,25 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

ΔI	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	13	-	-
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	4	-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
Zie schema					
		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☐ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☒ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota: Badkamer nog niet afgewerkt.

CONCLUSIE


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 22-03-2041
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VOOR DE TECHNISCHE DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Koen De Lausnay


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit.


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

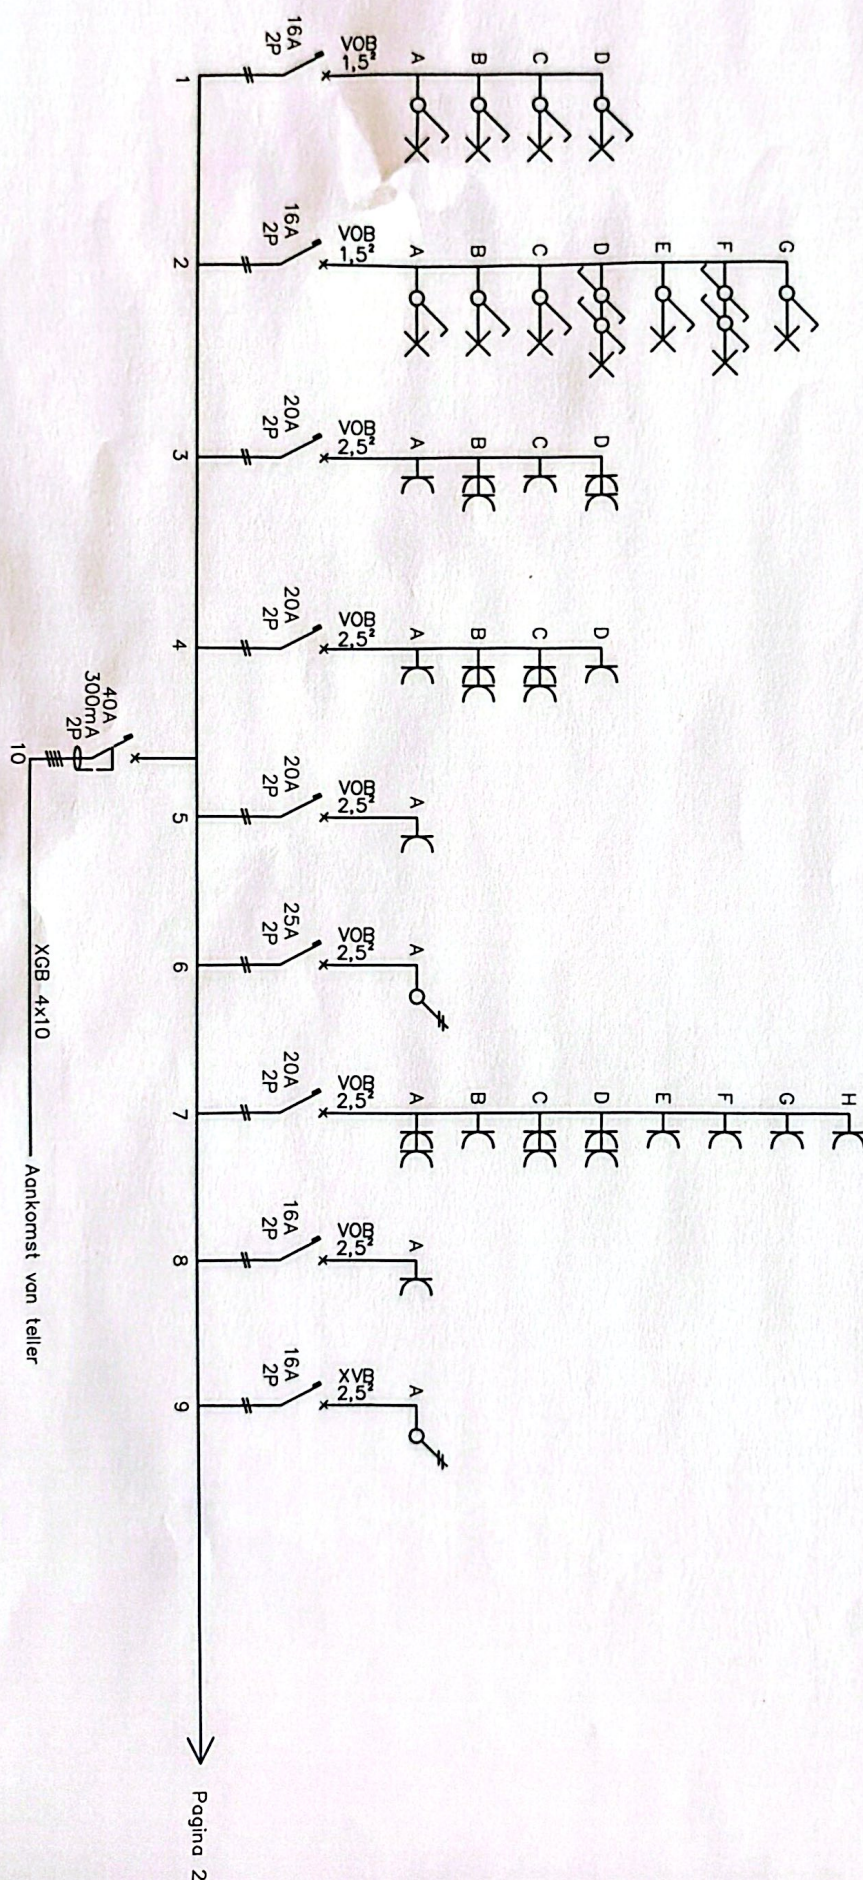

1A Licht keuken
1B Licht eetkamer
1C Licht woonkamer
1D Licht terras

2A Licht berging
2B Licht wc
2C,D Licht slaapkamers
2E Licht dressing
2F Licht gang
2G Licht inkom

3A-D Stopc. woonkamer

4A-D Stopc. keuken

5A Oven

6A Kookvuur

7A Stopc.berging
7B Stopc.dressing
7C-G Stopc.slaapkamers
7H Stopc.gang

8A Centrale verwarming


9A Ventilatie

12A Wasmachine

13A Droogkast

14A Vaatwas

15A Stopc. badkamer
15B Licht badkamer

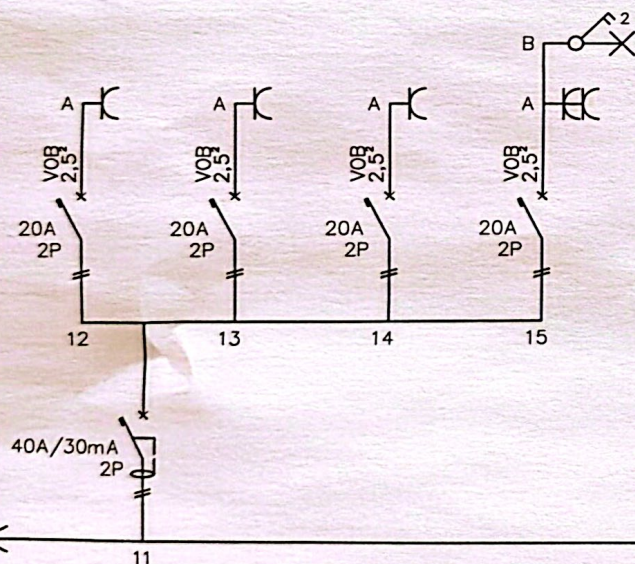

Pagina 1

EI ELECTRO - INDUSTRIELLE
St-Jansplein 17
2080 ANTWERPEN
Tel: 03/231 19 58
Fax: 03/231 81 81

OPDRACHTGEVER:
Antwerpse Bouwwerken

PROJECT: Bouwensstraat 27,2140 Borgerhout

TITEL: Blok 29/App.3.01

Laatste wijziging: 15-03-2016
Projectnr.: A133 TEKnr:

INDEX:

Bl. 2
2 Bl.
