

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

201718973/05

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 197575

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**Verantwoordelijke voor de werken :****Installatie :****Eigenaar of beheerder :**

Naam, voornaam: **GEBROEDERS
MINNEN BUZA**
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE **085408773**

Naam, voornaam: **HELSE DOORMANISCHAPES**
Adres: **WANMOLENSTRAAT 3612**
Post nr. + Stad: **2400 MOL**
Tel.: **2470 RUTLE**

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verzwaren	☐ verkoop van een wooneenheid		☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.:	meterstand dag : nacht :	
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :	
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord : X mm ² - Type :		
	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 13
	APP. 05		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 66 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 240 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	WIEKEN, BASH, VIAL. NOS NIET GEPIJLST
	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :


- ☒ De nieuwe installatie **voldoet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

30/10/2017☒ door hetzelfde erkend organisme (*).**Agent bezoeker :**Naam: **HENS FRANK** Agent nr.: **1974** Datum: **30/10/2017**Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : **1** ☒ Eëndraadsschema(s) : **2**

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




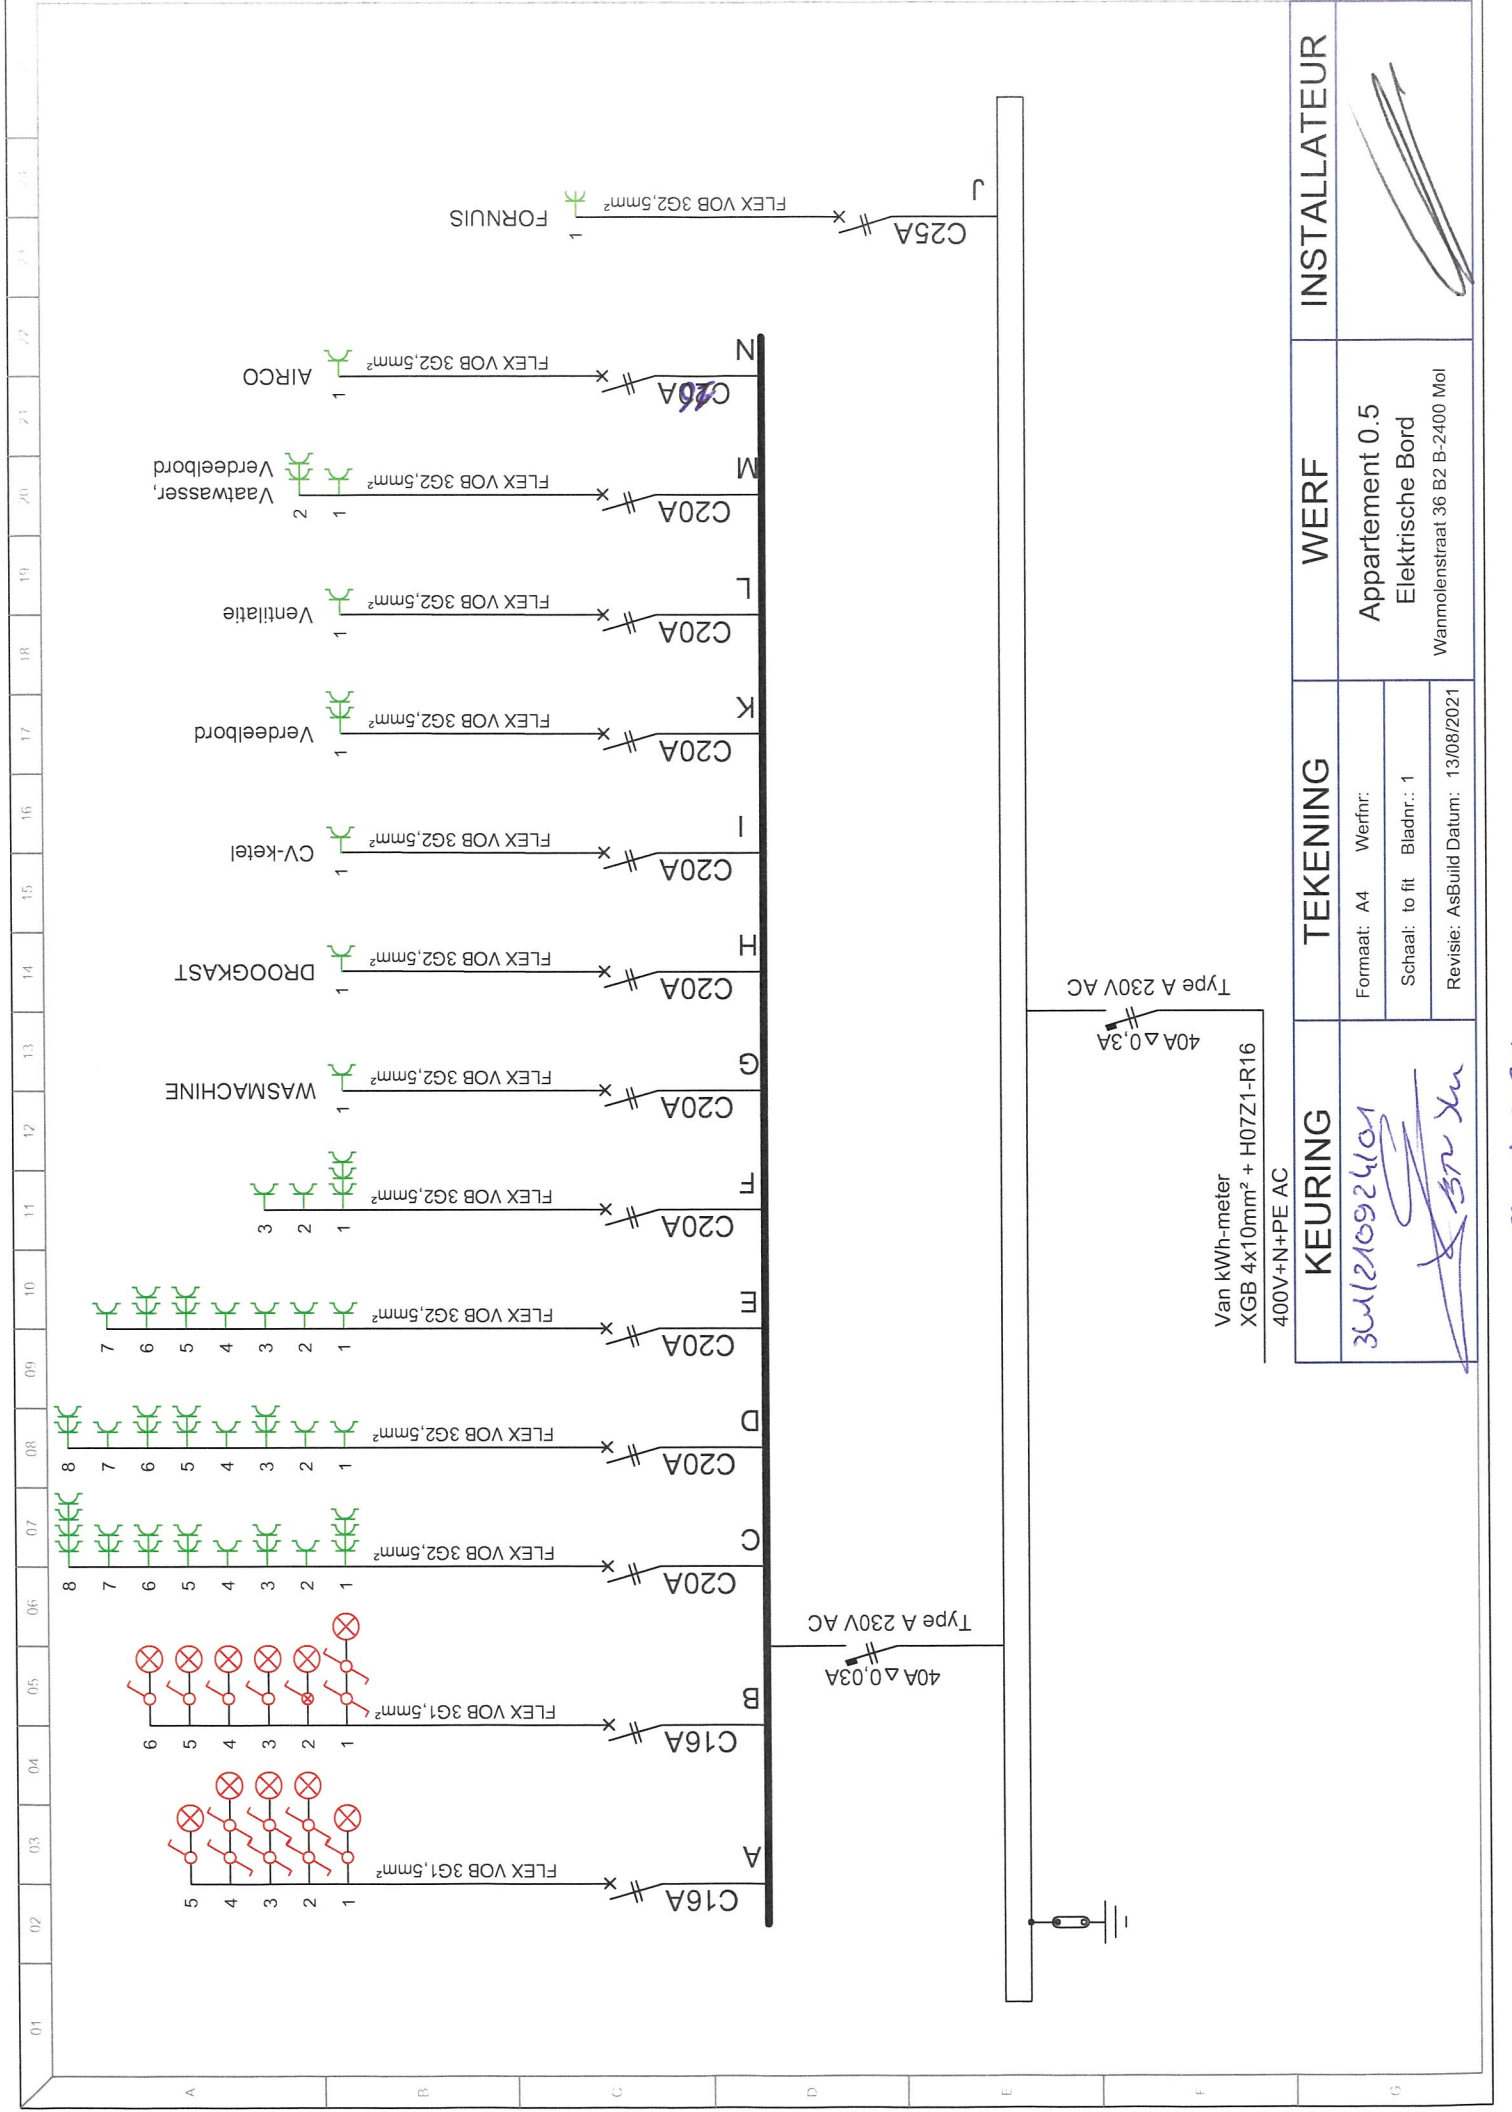


KEURING		TEKENING		WERF	INSTALLATEUR	
361210924/01 	Formaat: A4	Werfnr:	Schaal: to fit			Appartement 0.5 Elektrische Bord
	Bladnr.: 1					
			Revisie: AsBuild Datum: 13/08/2021		Wanmolenstraat 36 B2 B-2400 Mol	

24-9-2024

APP. 0.5

~~STOPCONTACTEN B3 EN D~~
~~STOPCONTACTEN B3 EN D~~

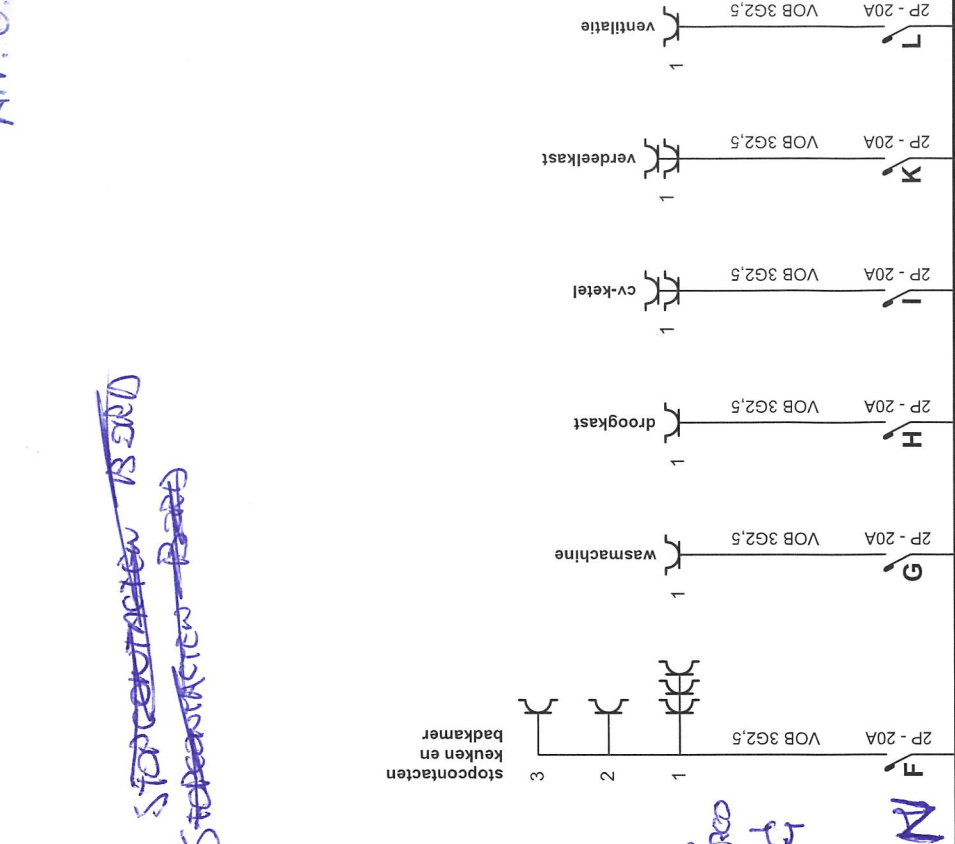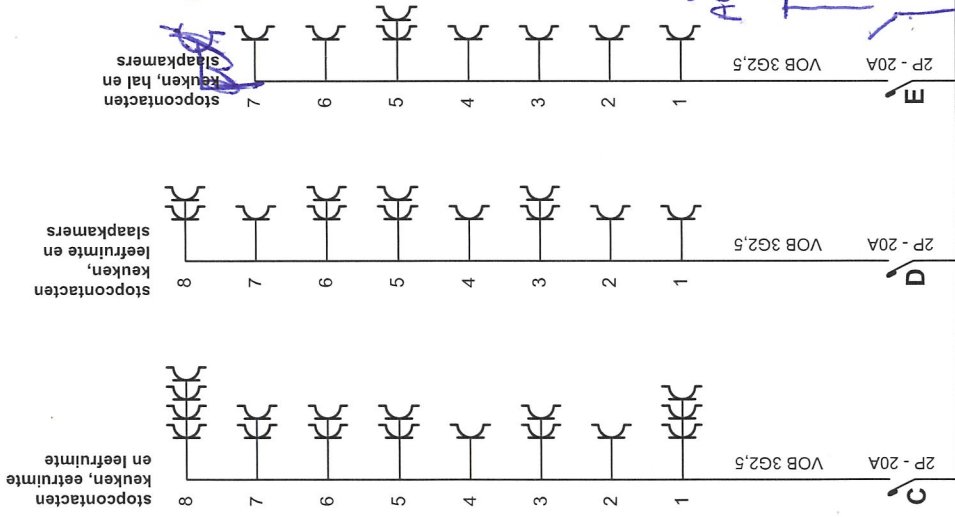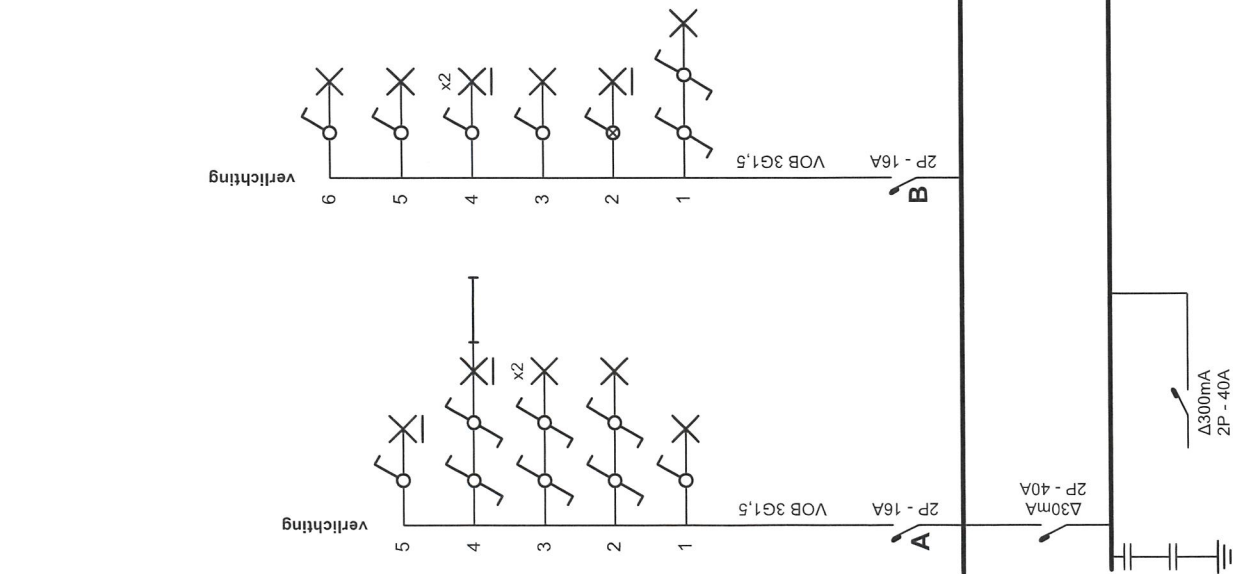


Plaats van de elektrische installatie
Dethier Mol app. 0.5
Wanmolenstraat 36 Bus 2
2400 Mol

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Retie
Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

p. 1/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz



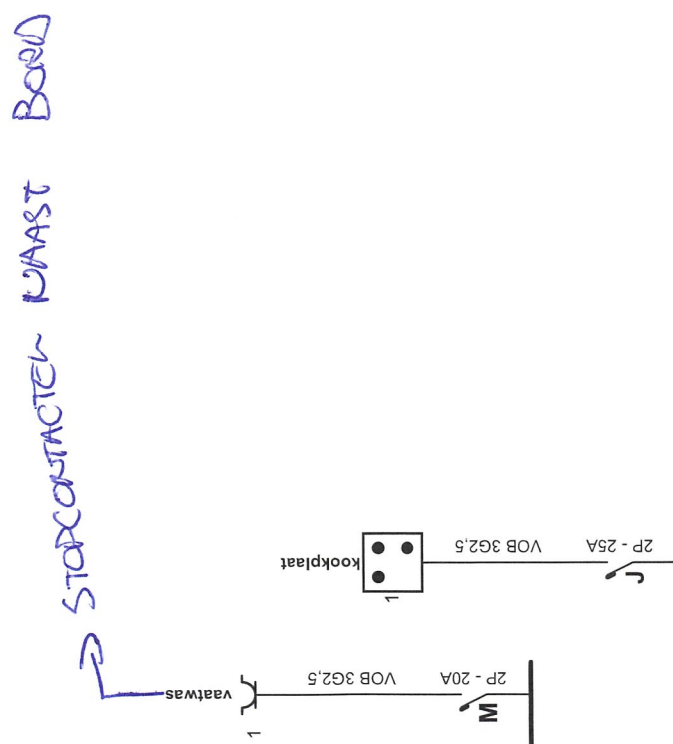

Plaats van de elektrische installatie
Dethier Mol app. 0.5
Wanmolenstraat 36 Bus 2
2400 Mol

p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

VINCENZI
VERBODEN SWERKEN

Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

- A** verlichting
- B** verlichting
- C** stopcontacten keuken, eetruimte en leefruimte
- D** stopcontacten keuken, leefruimte en slaapkamers
- E** stopcontacten keuken, hal en slaapkamers
- F** stopcontacten keuken en badkamer
- G** wasmachine
- H** droogkast
- I** cv-ketel
- K** verdeelkast
- L** ventilatie
- M** vaatwas
- J** kookplaat

Plaats van de elektrische installatie
Dethier Mol app. 0.5
Wanmolenstraat 36 Bus 2
2400 Mol

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Retie
Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

VINNEN
ELECTRICITEITSWERKEN

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

