



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. 90149929349/ART



N 299988

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :	
Naam, voornaam : <u>Robert Van der Elst</u>		Naam, voornaam : <u>Robert Van der Elst</u>		Adres : <u>Boezemlaan 22</u>	
Ident. Kaart nr. : <u>123456789</u>		Post nr. + Stad : <u>9680 BBOLEN</u>		Tel. : <u>011 234 5678</u>	
BTW nr. : BE					

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)					
☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271 bis
☐ Art 271	☐ periodiek	☒ controle	☐ ...	☐ Art 87	☐ Art 278
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88	☐ Art ...
				☒ Wooneenheid	☒ Huishoudelijke werkeenheden
				☒ Gemeenschappelijke delen	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :	
Gegevens verdeler	EAN : <u>91492746</u> meterstand dag : <u>37801</u> nacht : <u>...</u> kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. : <u>...</u> meterstand : <u>...</u> kWh excl. nacht meter : <u>...</u>
Beschrijving installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ ...
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ ...
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ ...
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>Bekabeling</u>
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>0.6</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>3</u>
☒ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :					
☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I ² /doorsnede
☒ Aardingsweerstand : <u>3.7</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>4</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.	
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden					


Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)	
Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Nihil</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Nihil</u>
Opmerkingen	<u>Nihil</u>
Visum DNB of aangestelde :	

Besluit(en) :	
☒ De nieuwe installatie	<u>voldoet</u> aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	<u>voldoet</u> aan het AREI.

Agent bezoeker :	
Naam : <u>J. MATHIE</u>	Agent nr. : <u>1117</u> Datum : <u>7.3.2013</u>

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : <u>...</u> ☐ Eéndraadsschema(s) : <u>...</u> ☐ ...	
---	--

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

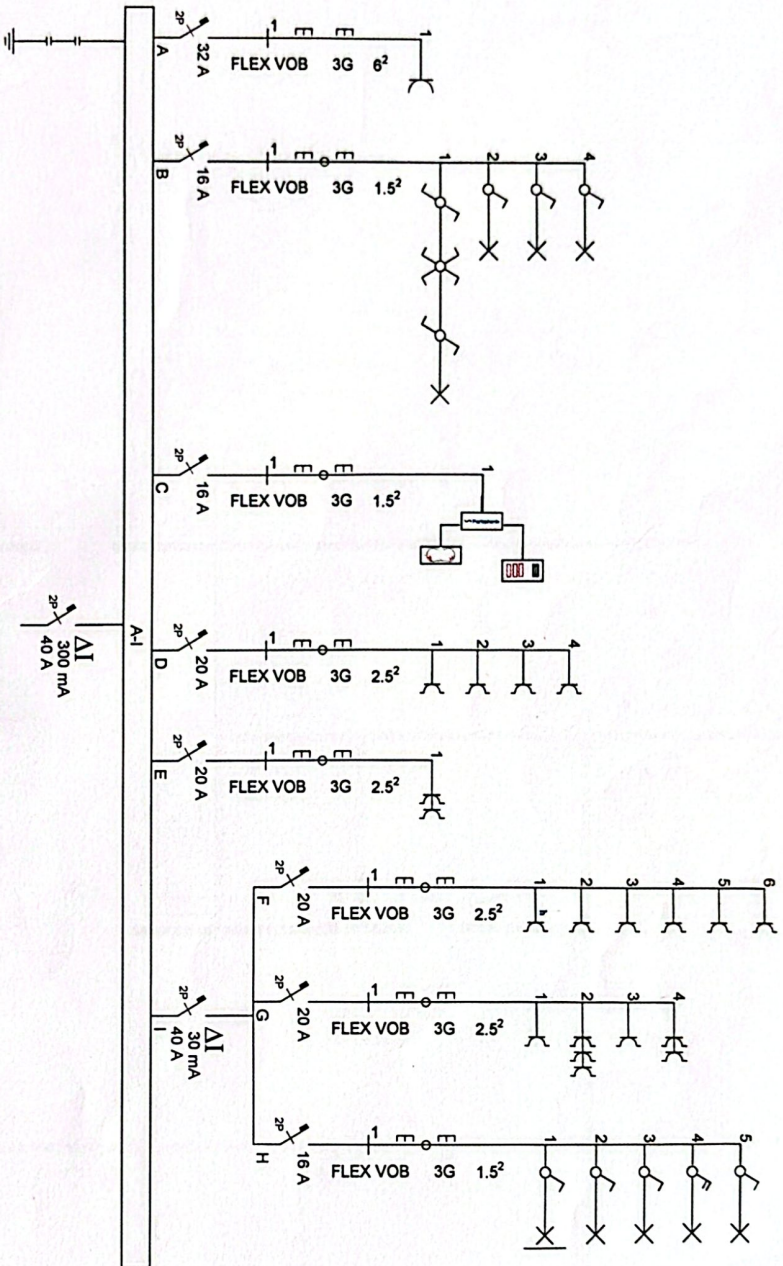

Graspolderlaan 20

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom: François Hendrickx BTW / TVA: BE 0459 202 652 Datum/Date: 08-02-2013 Handtek/Sign:	Organis.: AIB Naam/Nom: Sijm Mathij Datum/Date: Handtek/Sign:	Naam/Nom: Pietrowicz Roman Straat/Rue: Graspolderlaan/20 Gemeen/Comm: 2660 Hoboken Handtek/Sign:	 FIX-O-CAD 2, 230V~ 02541

